


# Rendición de Cuentas 2024

EDITORIAL

# ASUNCIÓN se MODERNIZA



Asunción, capital de la República del Paraguay, en este primer cuarto del siglo XXI, avanza con paso firme hacia la modernidad. Comienza un nuevo milenio y, con él, una nueva etapa para esta ciudad, de alma generosa y espíritu resiliente.

Sin renunciar a su esencia solidaria, la misma que en tiempos coloniales la convirtió en "**Madre de Ciudades**", hoy se reinventa con dinamismo y visión de futuro.

La ciudad crece a un ritmo vertiginoso, ya que zonas que antes eran tranquilas barriadas, hoy exhiben modernos rascacielos, nuevos centros comerciales, avenidas renovadas y espacios públicos que reflejan una urbe vibrante, decidida a ser protagonista en la región.

Se registra una transformación pocas veces vista en su historia, que proyecta un porvenir promisorio para la capital y para todo el país.

Este proceso de cambio no es fruto del azar, sino del esfuerzo conjunto entre el Gobierno del Paraguay y las autoridades municipales, mediante una labor patriótica, que permitió planificar, estratégicamente, el desarrollo urbano, priorizando el bienestar ciudadano, sin perder de vista nuestra forma única de ser y de sentir la vida.



# FINANZAS

Rendición de  
Cuentas  
2024



# INGRESOS RECAUDADOS


en millones de guaraníes

REPARTICIÓN RECAUDADORA	2024
Administración Central	1.051.038
Administración Descentralizada	37.673
Terminal de Ómnibus de Asunción	20.083
Dirección de Abastecimiento de Asunción	14.055
Centro Paraguay Japonés	3.032
Policlínico Municipal	503
TOTAL AA CC + EE DD	1.088.711
Transferencias del Gobierno Central	674
Recursos de Financian. y Donaciones	23.771
TOTAL GENERAL	1.113.156

## EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Por Niveles del Objeto del Gasto

Millones de Guaraníes

NIVEL DE OBJETO DEL GASTO		PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO ENE - DIC	% EJEC	GASTOS OBLIGADOS	
100	Servicios Personales	788.089	727.234	92%		
200	Servicios No Personales	232.517	114.346	49%		
300	Bienes Cambio e Insumos	205.890	79.754	39%		
500	Inversión Física	840.990	104.964	12%		
700	Servicio de la Deuda Pública	134.231	134.231	100%		
800	Transferencias	134.272		65%		
900	Otros Gastos	24.179	5.301	22%		
TOTAL GENERAL		2.360.168	1.253.270	53%		

- SERVICIOS PERSONALES 58,0%
- SERVICIOS NO PERSONALES 9,1%
- BIENES DE CONSUMO E INSUMO 6,4%
- INVERSIÓN FÍSICA 8,4%
- SERV. DE LA DEUDA PÚBLICA 10,7%
- TRANSFERENCIAS 7 %
- OTROS GASTOS 0,4%

# Rendición de Cuentas 2024

## O B R A S

### DESAGÜE PLUVIAL EL GRAN DESAFÍO

Uno de los desafíos históricos de Asunción ha sido su accidentada geografía. Las siete colinas sobre las que se asienta la ciudad, generan pronunciadas pendientes que, en días de lluvia, dan origen a intensos raudales.


Desagüe pluvial del Mercado de Abasto, cuenca Itay y Lambaré

Este fenómeno natural, agravado por el pavimento urbano sin drenajes adecuados, durante décadas generó pérdidas materiales incalculables e incluso de vidas humanas.

Por ello, resolver el problema de los raudales se convirtió en una prioridad. Era imposible hablar de desarrollo sostenible sin atacar de raíz este drama urbano. Así, la construcción de desagües pluviales dejó de ser una deuda histórica y pasó a ser una política de Estado.

Aunque estas obras no siempre son visibles a simple vista, tienen un impacto directo en la calidad de vida. Los grandes túneles subterráneos, verdaderos acueductos de hormigón, algunos de dimensiones tan amplias como para permitir el paso de vehículos, hoy canalizan las aguas de lluvias que antes devastaban calles, viviendas y comercios.

A lo largo de las últimas décadas, no se pudo calcular con exactitud cuánto perdió la ciudad por causa de los raudales, pero sí se puede afirmar que estas obras marcan un antes y un después en la historia urbana de Asunción.

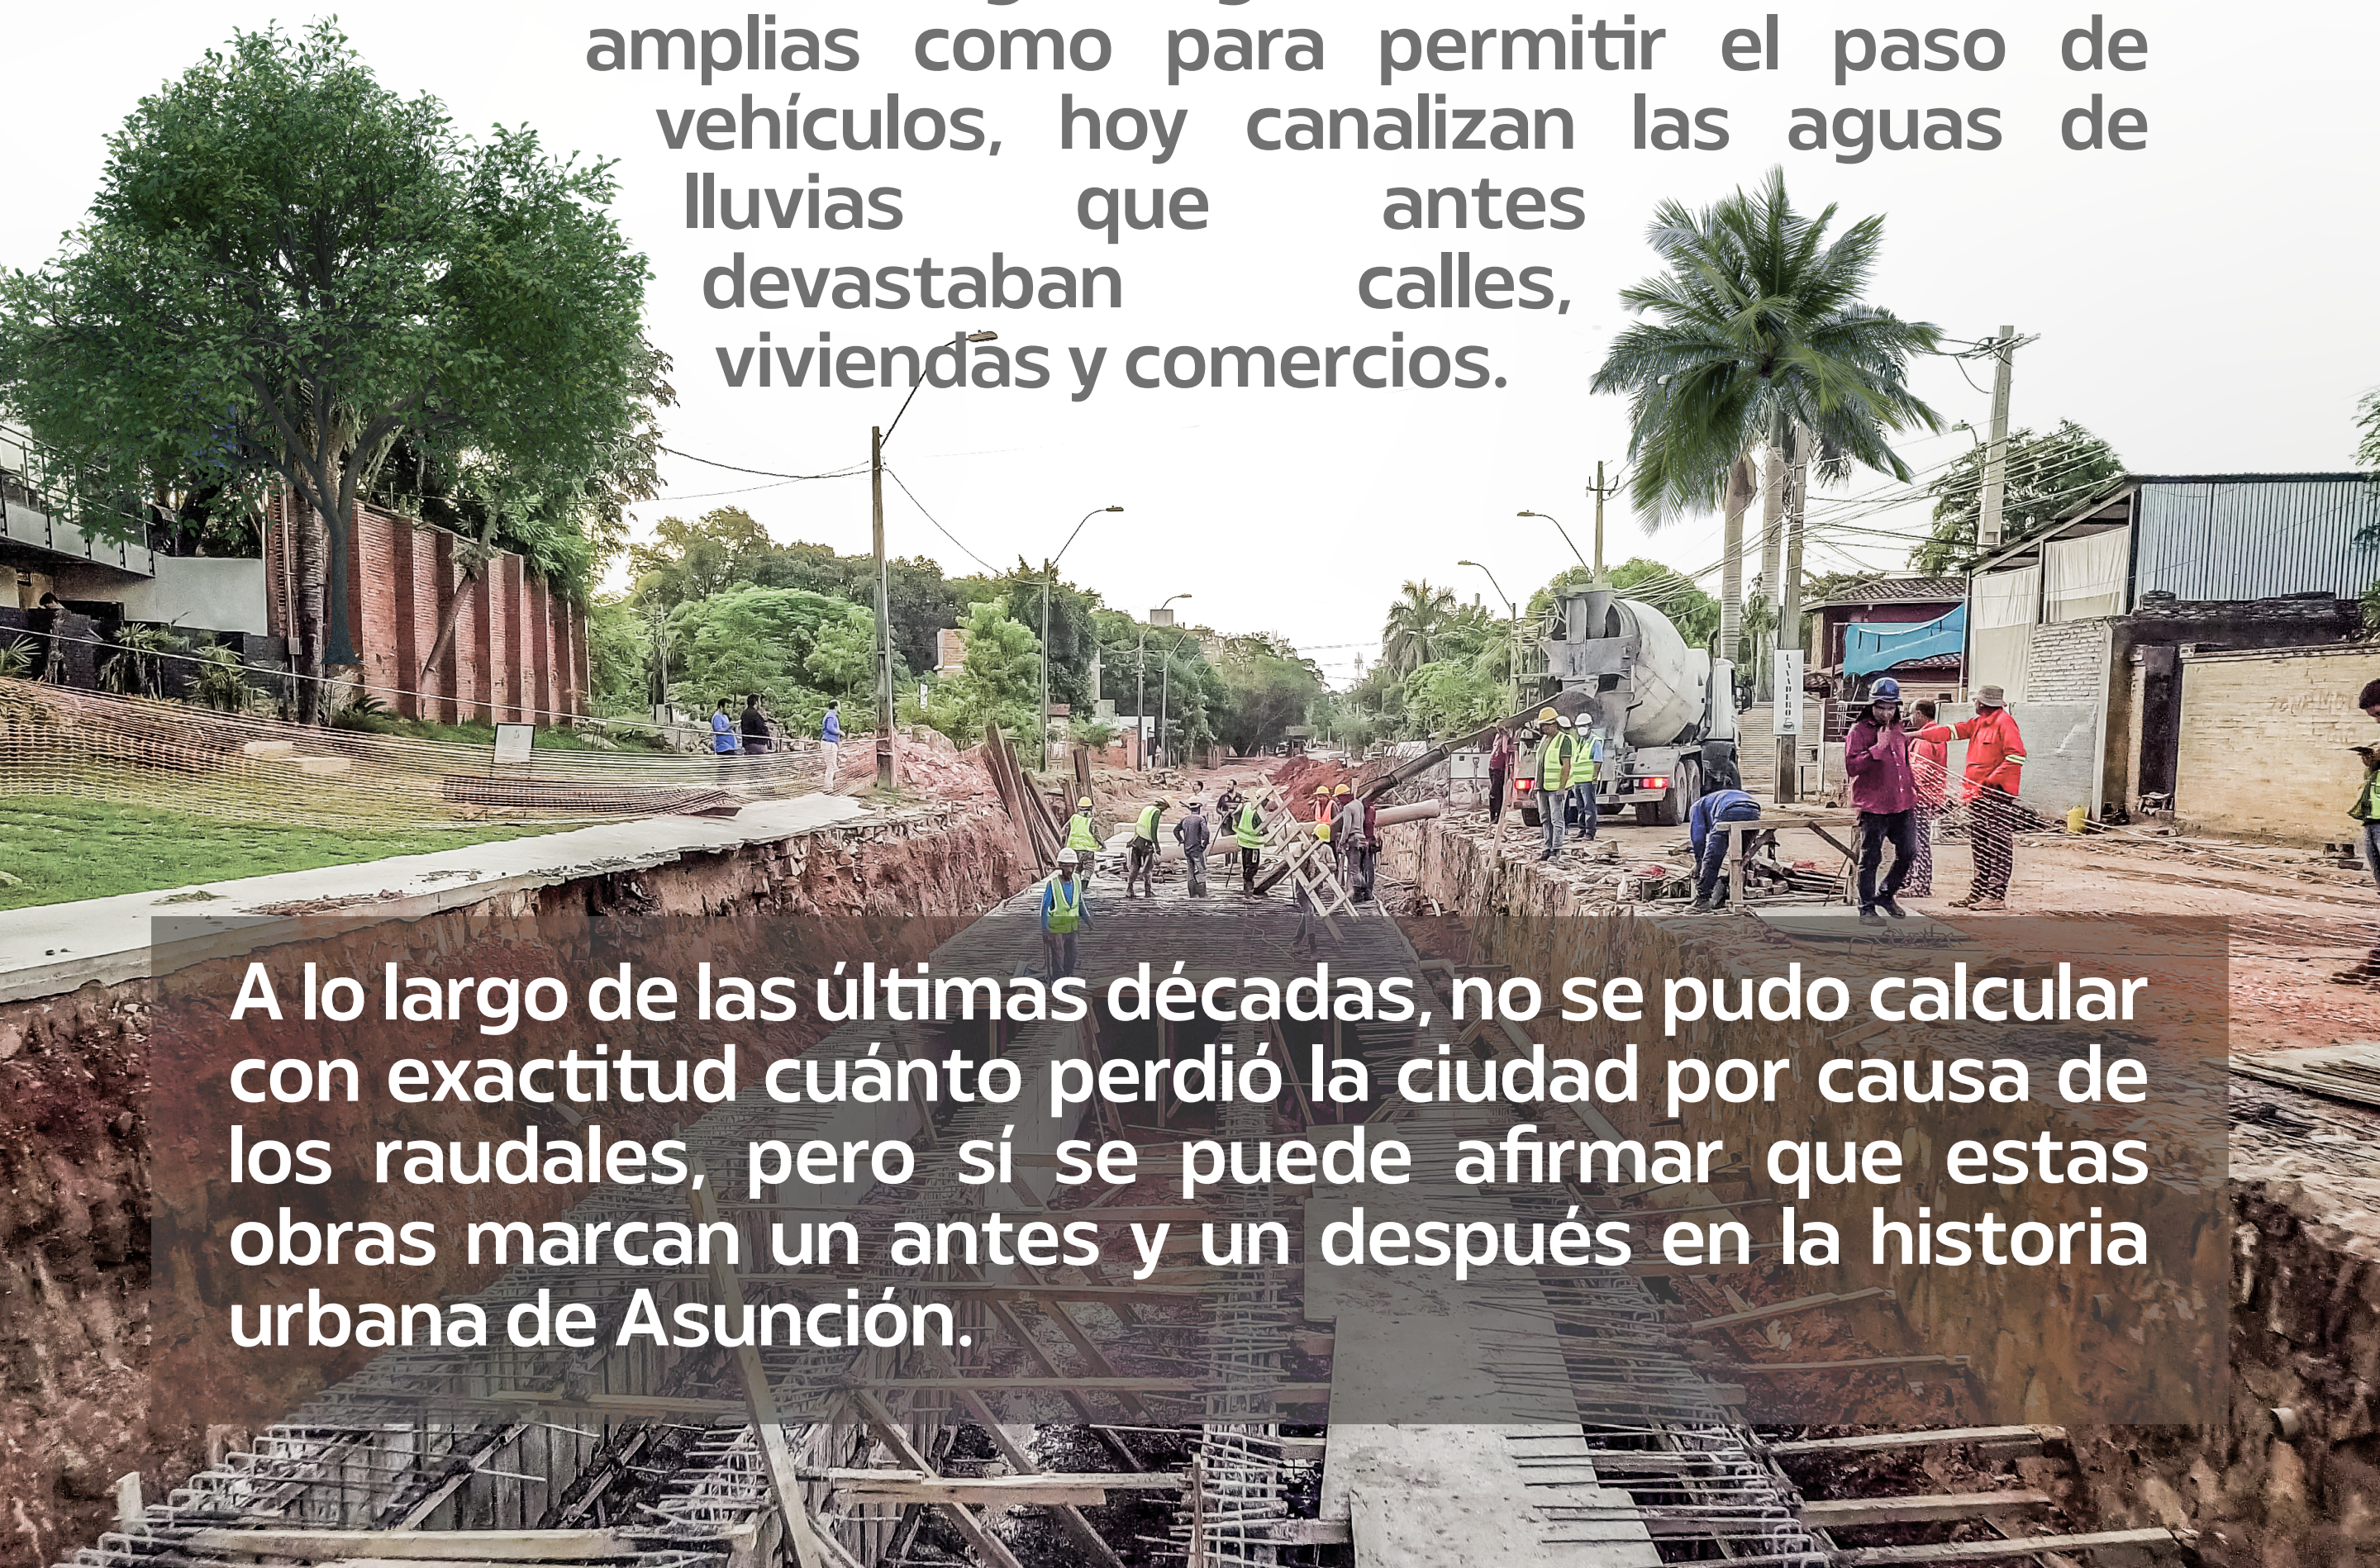

## OBRAS EN MARCHA: CUENCAS QUE TRANSFORMAN

La Municipalidad de Asunción avanza con la construcción de nuevas cuencas pluviales, estratégicamente ubicadas: cuencas del Arroyo Itay y Lambaré.

Ya culminaron importantes obras como el primer tramo de la Avenida Molas López y también la de las Cuencas Isabel La Católica y Kannonikoff y Rocio Cabriza.



**Avance de obras de  
entubamiento sobre la calle  
De la Conquista.**

*Desagüe Pluvial Isabel La Católica*

**Vista de la obra terminada**  
*Desagüe pluvial de la cuenca  
Isabel La Católica*



Estas obras no solo reducen el riesgo de anegamientos sino, además, revalorizan zonas enteras de la ciudad, elevan su perfil urbano y consolidan una Asunción más moderna, segura y habitable.

ES FOTOCOPIA FIEL DEL ORIGINAL A SOLO EFECTO DE TRÁMITES MUNICIPALES.

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS														
DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES														
OBRAS EJECUTADAS, EN EJECUCIÓN Y CONTRATADAS - AÑO: 2024 (al 31/12/2024)														
Descripción de la obra	ID / lote	Contratista	Monto contrato original (Gs)	Monto ampliación de contrato (suma de convenios modif.)	Detalle	Pavim. H° hidráulico (m2)	Pavim. asfáltico (m2)	Remoc. reposic. empedrado (m2)	Pavim. empedrado sobre terraplén (m2)	Muros de PBC y gaviones en arroyos (m3)	Desagüe pluvial (m)	Mejoramiento paseo central (m2)	Intervención en puentes (un)	Situación actual
DESAGÜE PLUVIAL														
OBRAS EJECUTADAS														
DESAGÜE PLUVIAL DE VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE ASUNCION - PLURIANUAL	413108	TECO S.R.L.	1.454.915.401		Desagüe pluvial en Tte. Zotti y De las Palmeras, Miguel Ángel Soler (A° Mburicaó), Kriskovich y Bonifacio Caballero, y Canal sobre la calle 25 Proyectada (492m de alcantarillas tubulares, 89m3 de muro de piedra bruta para canal)						492			Avance 100%, con Recepción Provisoria
DESAGÜE PLUVIAL Y MEJORAMIENTO VIAL DE LAS CALLES ROCIO CABRIZA, CAPITAN JOSE DOMINGO LOMBARDO, TTE. GREGORIO NARVAEZ Y TTE. FELIX CAÑETE	388777	Consorcio Nueva Esperanza	9.343.268.057	1.859.299.712	Desagüe pluvial y mejoramiento vial sobre las calles Rocío Cabriza, Capitán José Domingo Lombardo, Teniente Gregorio Narváez y Teniente Félix Cañete (899m alcantarillas celulares, 5.710m2 pavimento asfáltico, 1.462m2 pavimento hormigón hidráulico) (según CM1)	1.462	5.710				899			Avance 100%, con Recepción Provisoria del Contrato original y Convenio Modificatorio 1
DESAGÜE PLUVIAL EN LA CUENCA DE LAS CALLES ISABEL LA CATÓLICA Y KANONNIKOFF	388594	Consorcio CPV	8.980.573.300	1.788.200.841	Desagüe pluvial y mejoramiento vial sobre las calles Alejo García, Pedro Gracia, Díaz de Solís, Dr. José Montero, De la Conquista e Isabel La Católica (1.105m de alcantarillas celulares, 6.232m2 de pavimento hormigón hidráulico) (según CM1)	6.232					1.105			Avance 100%, con Recepción Provisoria del Contrato original y Convenio Modificatorio 1
DESAGÜE PLUVIAL EN LA CUENCA DE LA AVENIDA DOCTOR FELIPE MOLAS LOPEZ	388451 (Lote 1)	TECSUL S.A.E.	31.176.244.418	6.219.469.037	Desagüe pluvial y mejoramiento vial con pavimento de H° en Av. Molas López entre Av. San Martín e Itapúa (1.835m alcantarillas celulares, 14.328m2 pavimento asfáltico, 27.530m2 pavimento hormigón hidráulico) (según CM2)	27.530	14.328				1.835			Avance 100%, con Recepción Provisoria del Contrato original, Convenio Modificatorio 1 y Convenio Modificatorio 2
Subtotal - OBRAS EJECUTADAS			60.821.970.766			35.224	20.038	0	0	0	4.331	0	0	
OBRAS EN EJECUCIÓN														
Desagüe Pluvial del Mercado de Abasto - cuencas Itay y Lambaré	421414 (Lote 1)	Consorcio Pluvial Abasto	71.393.978.785		Desagüe pluvial en cuenca arroyo Itay (4580m de alcantarillas celulares, 37.151m2 de pavimento de H° hidráulico)	37.151					4.580			En ejecución, avance 27%
Desagüe Pluvial del Mercado de Abasto - cuencas Itay y Lambaré	421414 (Lote 2)	Consorcio CCC - TECSUL	64.777.837.460		Desagüe pluvial en cuenca arroyo Lambaré (3.922m de alcantarillas celulares, 30.456m2 de pavimento de H° hidráulico)	30.456					3.922			En ejecución, avance 24%
DESAGÜE PLUVIAL EN LA CUENCA DE LA AVENIDA DOCTOR FELIPE MOLAS LOPEZ	388451 (Lote 2)	CCC S.A.	35.932.632.615	6.891.203.319	Desagüe pluvial y mejoramiento vial con pavimento de H° en Av. Molas López e/ Itapúa y arroyo Ybyra'í (1.261m alcantarillas celulares, 450m2 pavimento asfáltico, 8.919m2 pavimento hormigón hidráulico) (según CM1)	8.919	450				1.261			En ejecución, avance 85% de Contrato original y CM1 (oct/2024)
Subtotal - OBRAS EN EJECUCIÓN			178.995.652.179			76.526	450	0	0	0	9.763	0	0	
OBRAS CONTRATADAS														
DESAGÜE PLUVIAL DE VARIAS CUENCAS DE LA CIUDAD DE ASUNCION	440909 (Lote 1)	CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS S.A. (COVIPA S.A.)	72.389.446.724		Desagüe pluvial en cuenca Barrio Santo Domingo (2.675m de alcantarillas celulares, 20.547m2 de pavimento de H° hidráulico, 12.337m2 pavimento asfáltico en calles intervenidas y desvíos)	20.547	12.337				2.675			Contrato firmado, a la espera de emisión de código de contratación por parte de DNCP
DESAGÜE PLUVIAL DE VARIAS CUENCAS DE LA CIUDAD DE ASUNCION	440909 (Lote 2)	TECO S.R.L.	42.305.412.809		Desagüe pluvial en cuenca Av. General Santos y San Antonio (1.832m de alcantarillas celulares, 7.670m2 de pavimento de H° hidráulico, 23.037m2 pavimento asfáltico en calles intervenidas y desvíos)	7.670	23.037				1.832			Contrato firmado, a la espera de emisión de código de contratación por parte de DNCP
Desagüe Pluvial de las calles María Felicidad González y El Dorado	407551	Chaves Construcciones	1.034.214.960		Desagüe pluvial (275m alcantarillas tubulares, 21m alcantarillas celulares, 45m3 muro de piedra bruta para canal)						296			Contrato firmado, a la espera de pago de anticipo
Subtotal - OBRAS CONTRATADAS			115.729.074.493			28.217	35.374	0	0	0	4.803	0	0	
MEJORAMIENTO VIAL														
OBRAS EJECUTADAS														
MEJORAMIENTO VIAL DE LAS CALLES TACUARY Y 38° PROYECTADA	405982 (Lote 1)	CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS SA	2.770.152.206		Construcción de 2.400 m2 de pavimento de hormigón hidráulico en la calle Tacuary e/ 30 y 35 Proyectada	2.400								Avance 100%, en proceso de Recepción Provisoria
MEJORAMIENTO VIAL DE LAS CALLES TACUARY Y 38° PROYECTADA	405982 (Lote 2)	CARLOS VICENTE GUEYRAUD CABALLERO	2.364.312.295		Construcción de 2.884 m2 de pavimento de hormigón hidráulico en la calle 38 Proyectada e/ Av. Japón y Tte. Cantaluppi	2.884								Avance 100%, en proceso de Recepción Provisoria
MEJORAMIENTO VIAL DE VARIAS CALLES DEL BAÑADO SUR, BARRIO SAN CAYETANO	388824	CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS SA	2.090.493.689	415.503.127	Mejoramiento vial en Alfredo Ramos (Brasil) entre 34 y 36 Proyectada, Alfredo Ramos (Brasil) entre 36 Proyectada hasta fin de calle, 38 Proyectada entre Paulino Antola (Rojas Silva) y Arroyo Morotí, Juan B. Ayala (Capitán Figari) entre 38 y 42 Proyectada, Calle sin nombre, entre 42 y 44 Proyectada, 33 Proyectada entre Rojas Silva y Brasil, Brasil entre 33 y 34 Proyectada, 39 Proyectada entre Cap. Figari y Pa'í Pérez (2.325m2 pavimento asfáltico, 5.355m2 pavimento hormigón hidráulico) (según CM2)	5.355	2.325							Avance 100%, con Recepción Provisoria del Contrato original y Convenio Modificatorio 2

ES FOTOCOPIA FIEL DEL ORIGINAL A SOLO EFECTO DE TRÁMITES MUNICIPALES.


DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS														
DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES														
OBRAS EJECUTADAS, EN EJECUCIÓN Y CONTRATADAS - AÑO: 2024 (al 31/12/2024)														
Descripción de la obra	ID / lote	Contratista	Monto contrato original (Gs)	Monto ampliación de contrato (suma de convenios modif.)	Detalle	Pavim. H* hidráulico (m2)	Pavim. asfáltico (m2)	Remoc. reposic. empedrado (m2)	Pavim. empedrado sobre terraplén (m2)	Muros de PBC y gaviones en arroyos (m3)	Desagüe pluvial (m)	Mejora miento paseo central (m2)	Intervención en puentes (un)	Situación actual
MEJORAMIENTO VIAL DE LAS AVENIDAS FERNANDO DE LA MORA Y CARLOS ANTONIO LÓPEZ	388424 (Lote 1)	Consorcio Sajonia	12.023.653.510	2.397.384.475	Mejoramiento vial de la Av. Fernando de la Mora entre Bartolomé de las Casas y Av. Defensores del Chaco (44.000m2 pavimento asfáltico, 5.707m2 pavimento hormigón hidráulico, 1.150m2 mejoramiento de paseo central) (según CM1)	5.707	44.000					1.150		Avance 100%, con Recepción Provisoria del Contrato original y Convenio Modificatorio 1
MEJORAMIENTO VIAL DE LAS AVENIDAS FERNANDO DE LA MORA Y CARLOS ANTONIO LÓPEZ	388424 (Lote 2)	Consorcio López	10.135.361.200	2.026.931.928	Mejoramiento vial de la Av. Carlos Antonio López entre Av. Colón y Teniente Pratts Gill (21.300m2 pavimento asfáltico, 5.700m2 pavimento hormigón hidráulico, 7.042m2 mejoramiento de paseo central) (según CM1)	5.700	21.300					7.042		Avance 100% del Contrato original y Convenio Modificatorio 1, en proceso de Recepción Provisoria
MEJORAMIENTO VIAL DE LAS AVENIDAS EUSEBIO AYALA Y BRUNO GUGGIARI	388295	TECSUL S.A.E.	8.999.419.477		Mejoramiento vial en los siguientes tramos: Av. Eusebio Ayala entre la Av. Choferes del Chaco y Cedro (15.450m2 pavimento asfáltico, 6.070m2 pavimento hormigón hidráulico, 1.006m2 mejoramiento de paseo central), Av. Eusebio Ayala entre la Av. Boggiani - D. Montanaro y M. Lynch - Defensores del Chaco (9.620m2 pavimento asfáltico, 1.040m2 mejoramiento de paseo central), Av. Bruno Guggiari entre la Av. Eusebio Ayala y Ecuador (19.900m2 pavimento asfáltico, 170m2 pavimento hormigón hidráulico).	6.240	44.970					2.046		Avance 100%, con Recepción Provisoria
Subtotal - OBRAS EJECUTADAS			43.223.211.907			28.286	112.595	0	0	0	0	10.238	0	
OBRAS EN EJECUCIÓN														
REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO	418303 (Lote 1)	GUILLERMO JOSÉ SÁNCHEZ CÁRDENAS	5.000.000.000		Contrato abierto - Remoción y reposición de empedrado. Al oeste de la Av. Gral. Santos-Av. Juan Domingo Perón	4.093		36.840						En ejecución, avance 12%
REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO	418303 (Lote 2)	LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO (PUNTAL CONSTRUCCIONES)	5.000.000.000		Contrato abierto - Remoción y reposición de empedrado. Al este de la Av. Gral. Santos-Av. Juan Domingo Perón y al norte de la Av. España-Av. Aviadores del Chaco	4.093		36.840						En ejecución, avance 13%
REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO	418303 (Lote 3)	ITINERA S.A.	5.000.000.000		Contrato abierto - Remoción y reposición de empedrado. Al este de la Av. Gral. Santos-Av. Juan Domingo Perón y al sur de la Av. España-Av. Aviadores del Chaco	4.093		36.840						En ejecución, avance 14%
MEJORAMIENTO VIAL CON PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN - PLURIANUAL	407558 (Lote 1)	OSCAR MOREL OSES	7.325.262.000		Empedrado sobre terraplén en 6 Barrios: de Las Residentas, Loma Pyta, San Blas, Santa Rosa, Zeballos Cue, Bella Vista	6.600			43.163					En ejecución, avance 54%
MEJORAMIENTO VIAL CON PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN - PLURIANUAL	407558 (Lote 2)	CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.	7.591.199.266		Empedrado sobre terraplén en 16 Barrios: Carlos Antonio López, Hipódromo, Itá Enramada, Las Lomas, Luis Alberto De Herrera, Madame Lynch, Mburucuya, Recoleta, Republicano, Roberto L. Petit, San Jorge, San Pablo, Santa Ana, Santísima Trinidad, Terminal, Botánico	6.600			42.364					En ejecución, avance 50%
MEJORAMIENTO VIAL CON PAVIMENTO DE HORMIGÓN HIDRÁULICO	405914 (Lote 1)	CARLOS VICENTE GUEYRAUD CABALLERO	7.000.000.000	1.400.000.000	Contrato abierto de pavimento de hormigón hidráulico, al este de la Av. Brasilia - Kubitschek	7.897	5.385							Avance 85% + Convenio Modificatorio 1 próximo a iniciarse
MEJORAMIENTO VIAL CON PAVIMENTO DE HORMIGÓN HIDRÁULICO	405914 (Lote 2)	CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A.	7.000.000.000	1.400.000.000	Contrato abierto de pavimento de hormigón hidráulico, al oeste de la Av. Brasilia - Kubitschek	9.581	3.727							Contrato original con Recepción Provisoria + Convenio Modificatorio 1 próximo a iniciarse
Subtotal - OBRAS EN EJECUCIÓN			46.716.461.266			42.957	9.112	110.520	85.527	0	0	0	0	
OBRAS CONTRATADAS														
MEJORAMIENTO VIAL DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO	421591 (Lote 1)	CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.	9.000.000.000		Contrato abierto - pavimento asfáltico. Al este de las Avenidas Brasilia - J. Kubitschek - B. Guggiari	8.250	19.250							Contrato firmado, a la espera de pago de anticipo
MEJORAMIENTO VIAL DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO	421591 (Lote 2)	CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS S.A. (COVIPA S.A.)	9.000.000.000		Contrato abierto - pavimento asfáltico. Al oeste de las Avenidas Brasilia - J. Kubitschek - B. Guggiari	8.250	19.250							Contrato firmado, a la espera de pago de anticipo
Subtotal - OBRAS CONTRATADAS			18.000.000.000			16.500	38.500	0	0	0	0	0	0	

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS														
DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES														
OBRAS EJECUTADAS, EN EJECUCIÓN Y CONTRATADAS - AÑO: 2024 (al 31/12/2024)														
Descripción de la obra	ID / lote	Contratista	Monto contrato original (Gs)	Monto ampliación de contrato (suma de convenios modif.)	Detalle	Pavim. H° hidráulico (m2)	Pavim. asfáltico (m2)	Remoc. reposic. empedrado (m2)	Pavim. empedrado sobre terraplén (m2)	Muros de PBC y gaviones en arroyos (m3)	Desagüe pluvial (m)	Mejora miento paseo central (m2)	Interven ción en puentes (un)	Situación actual
RECEPCIÓN DEFINITIVA EMITIDA EN 2024														
MEJORAMIENTO VIAL DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN	376826 (Lote 4)	LUIS RODRIGO BÓVEDA SAMANIEGO	4.657.014.220		Construcción de 46.475m2 de pavimento tipo empedrado en los barrios Recoleta y San Cristóbal – L.A. de Herrera	1.600		46.475						Con Recepción Definitiva (emitida en 2024)
Subtotal - RECEP. DEFINITIVA 2024			4.657.014.220			1.600	0	46.475	0	0	0	0	0	
CONSTRUCCIÓN DE MUROS Y REPARACIÓN DE PUENTES														
OBRAS EN EJECUCIÓN														
REPARACIÓN Y REFUERZO DE VARIOS PUENTES DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN	421824	CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS S.A. (COVIPA S.A.)	4.940.290.205		Puentes: Av. 21 Proyectadas entre México y Antequera (2 puentes), Av. Juan Domingo Perón entre Porã y Chivato, Puente Mayor Infante Rivarola y Mburicaó, Puente Reclus y Mburicaó, Puente Av. Colón entre Haedo y Gral Díaz (sobre el arroyo Jaén), Puente Tte. Villalón y Arroyo Ferreira, Puente 27 Proyectadas y Capitán Figari, Puente 38 Proyectadas y Arroyo Ferreira, Puente 29 Proyectadas y Arroyo Ferreira, Puente Tte. Garay y Arroyo Ferreira, Puente Casanello y Arroyo Ferreira, Puente Pizarro y Arroyo Lambaré								12	En ejecución
Construcción de muros en las márgenes de arroyos de la Ciudad de Asunción bajo la modalidad de Contrato Abierto	421421 (Lote 1)	CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS SA	7.000.000.000		Contrato abierto. LOTE 1: LAMBARÉ, LEANDRO SOSA, FERREIRA, ZANJA MOROTÍ, SALAMANCA (PARAGUARI), MBURICA, JARDIN, JAÉN, GUAZU (CAUCE ANTEQUERA), CAUCE PERÚ, LAS MERCEDES, BELLA VISTA, entre otros (7.515m3 de muros de piedra bruta y 835m3 de H°A°, equivalentes a 0,98Km de protección de márgenes)					7.515				En ejecución, avance 75%
Construcción de muros en las márgenes de arroyos de la Ciudad de Asunción bajo la modalidad de Contrato Abierto	421421 (Lote 2)	LUIS RODRIGO BÓVEDA SAMANIEGO	7.000.000.000		Contrato abierto. LOTE 2: MBURICAO, SANTO DOMINGO, MBURICAO MI, YBYRAI, YNE, TRES PUENTES-CUE, TRES PUENTES (BOTÁNICO), ZEBALLOS (LAS COLINAS), ITAY, entre otros (7.515m3 de muros de piedra bruta y 835m3 de H°A°, equivalentes a 0,98Km de protección de márgenes)					7.515				En ejecución, avance 72%
Subtotal - OBRAS EN EJECUCIÓN			18.940.290.205			0	0	0	0	15.030	0	0	12	
RECEPCIÓN DEFINITIVA EMITIDA EN 2024														
PROTECCIÓN DE MÁRGENES DE ARROYOS DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN	388986 (Lote 2)	LUIS RODRIGO BÓVEDA SAMANIEGO	2.029.595.621		Construcción de 2.901m3 de muros de piedra bruta y 1.410m3 de gaviones en los arroyos Salamanca, Ferreira y Morotí					4.311				Con Recepción Definitiva (emitida en 2024)
Subtotal - RECEP. DEFINITIVA 2024			2.029.595.621			0	0	0	0	4.311	0	0	0	
TOTAL GENERAL			489.113.270.657			229.310	216.069	156.995	85.527	19.341	18.897	10.238	12	

Como se podrá notar, entre las obras viales de infraestructura donde más inversiones se destinaron, en la administración Óscar Rodríguez, están los desagües pluviales, en el entendimiento que estas son fundamentales para introducir a nuestra urbe capital en la modernidad, brindando confort y seguridad vial a los pobladores de la ciudad.

Salta a la vista cómo cambió la avenida Molas López con el desagüe pluvial y la nueva pavimentación. Esta hermosa avenida está bordeada de edificios de altura, brindando una visión cosmopolita de la ciudad, que compite con las otras urbes de la región.

El futuro es promisorio para Asunción, teniendo en cuenta lo avanzado de las obras de los desagües pluviales en las zonas del Mercado de Abasto y del barrio San Pablo, que abarca las cuencas de los arroyos Itay y Lambaré, respectivamente, partidas en dos lotes.

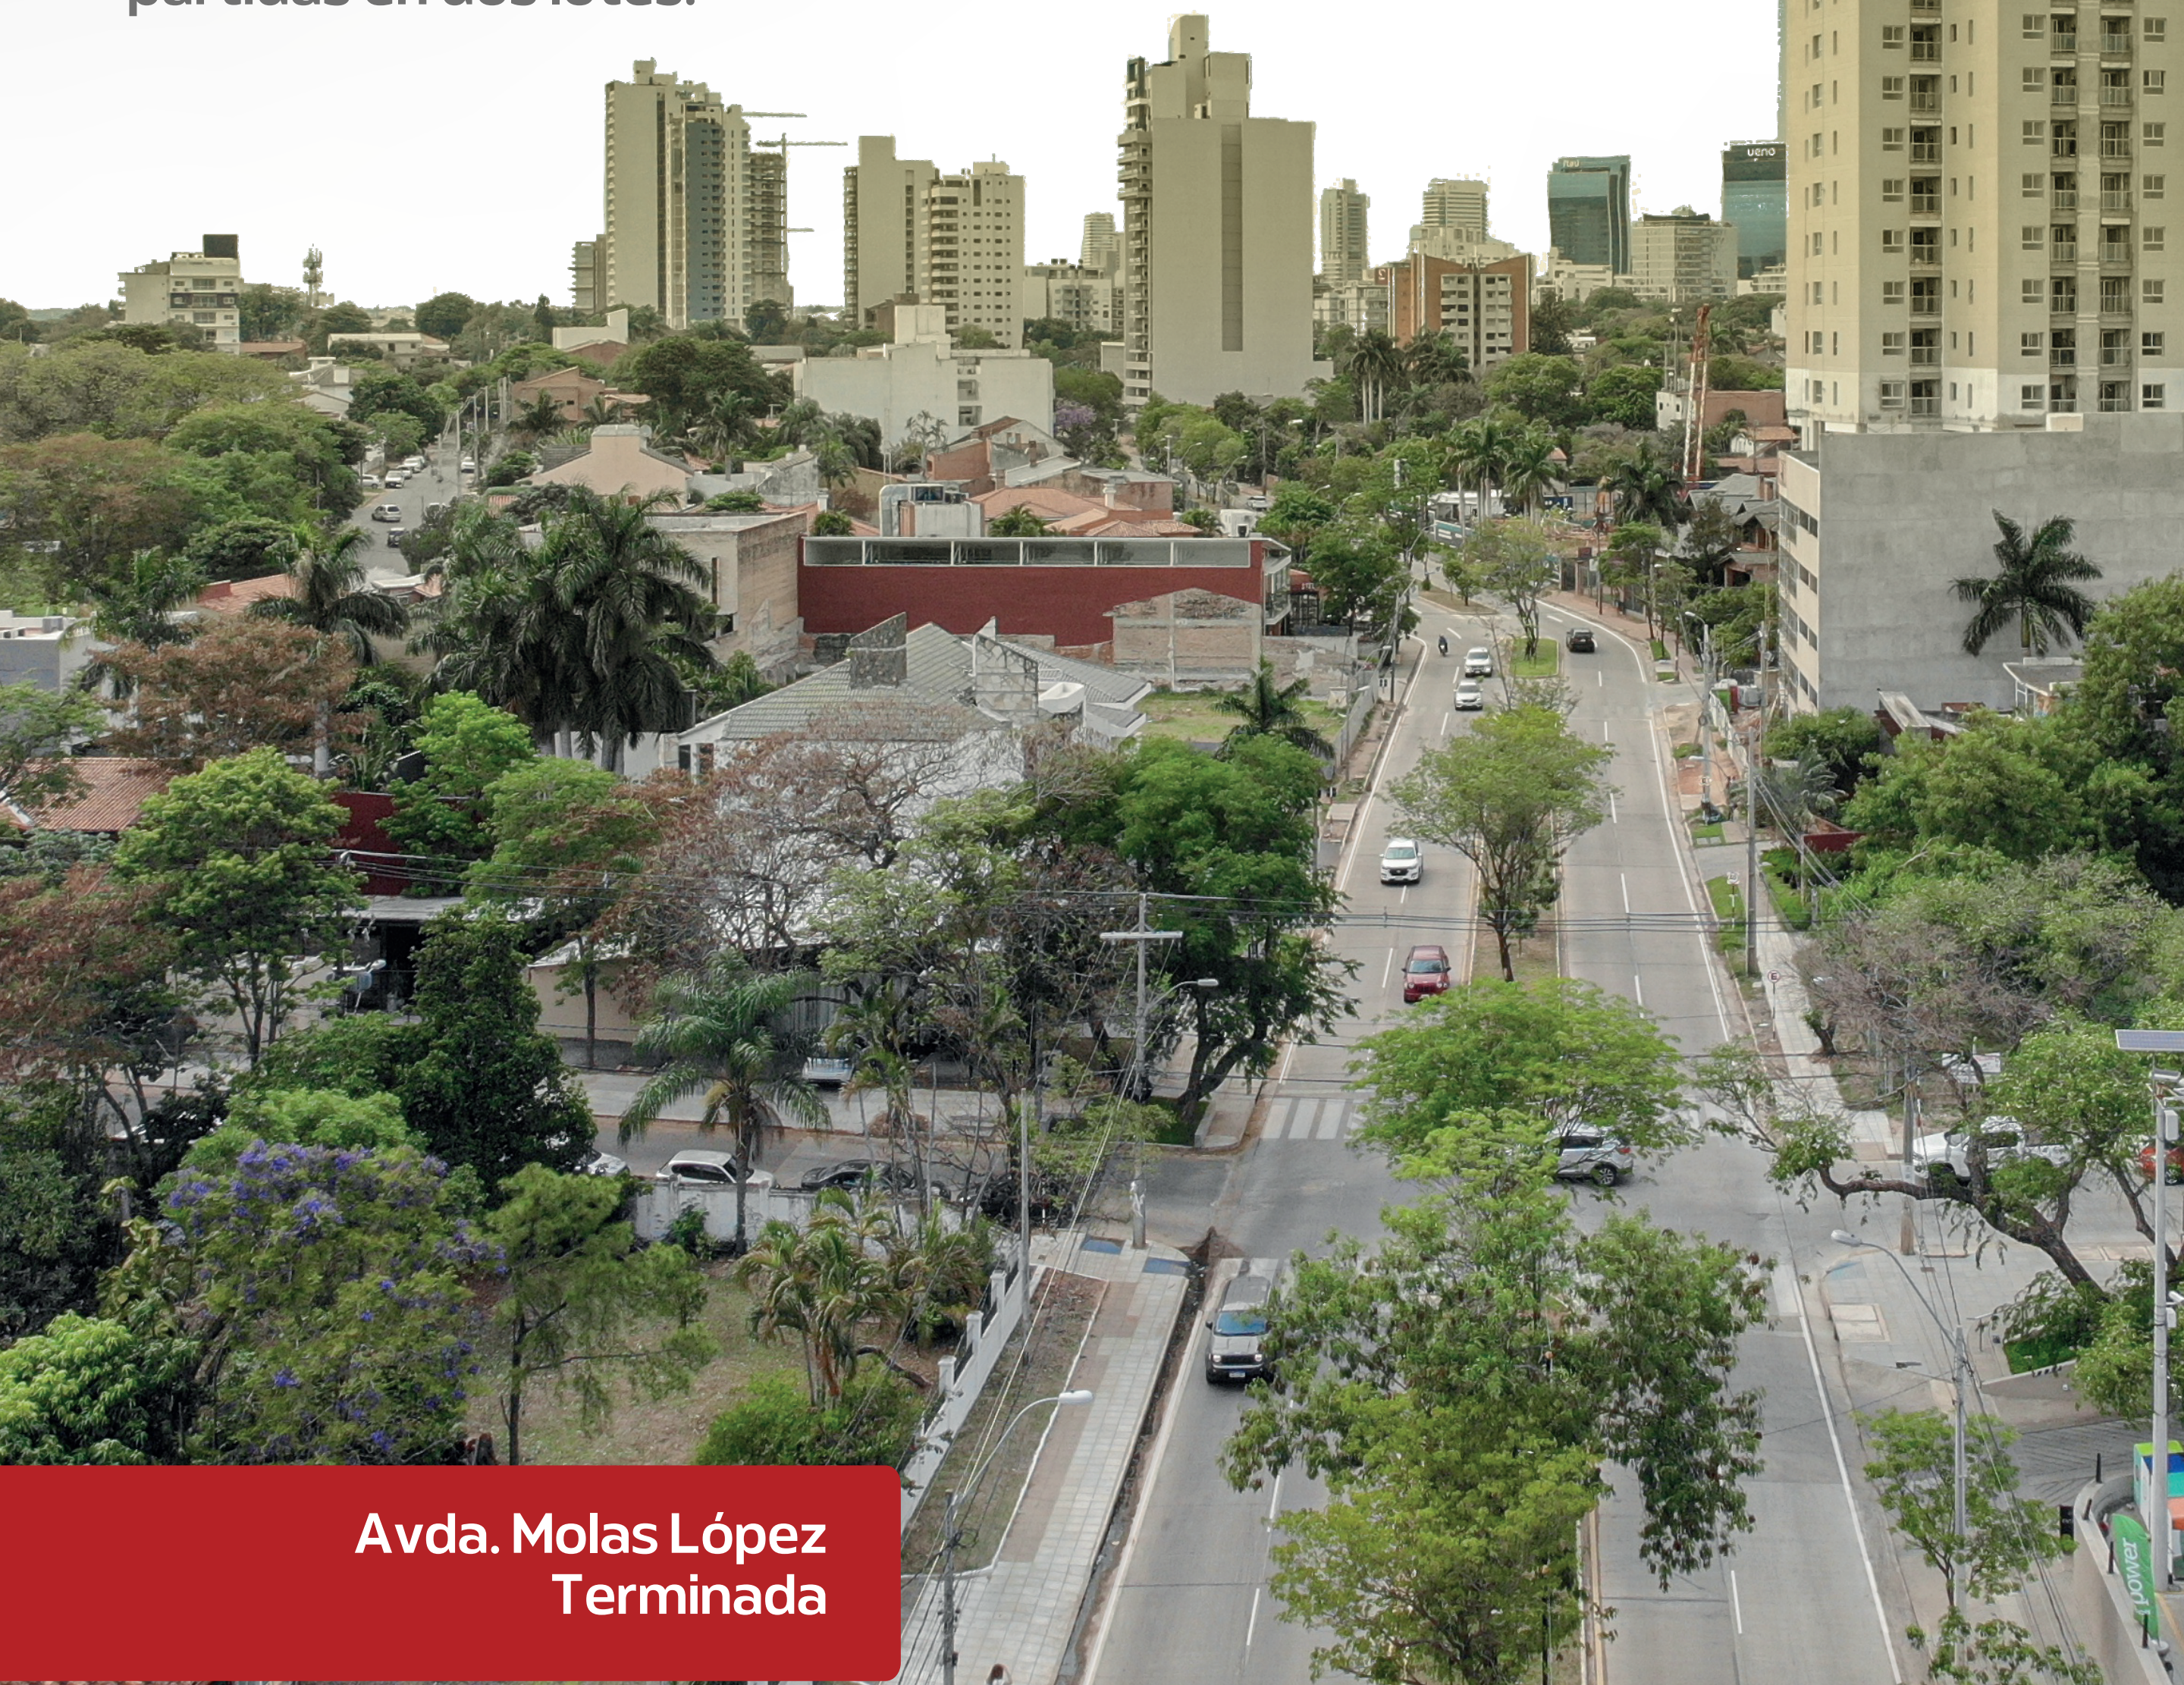

**Avda. Molas López  
Terminada**



Desagüe pluvial Rocio Cabriza



## MEJORAMIENTO VIAL

En el año 2024, se dio gran preponderancia también a las obras viales, ya que, en un rápido desglose, se puede observar que no solamente fueron reparadas y ampliadas las arterias céntricas, sino también los accesos viales de calles de las áreas suburbanas de Asunción.

### Datos sobre este tipo de inversiones:

Pavimento hidráulico: 71.243 m<sup>2</sup>

Pavimento asfáltico: 274.352 m<sup>2</sup>

Remoción y reposición  
de empedrado: 110.520 m<sup>2</sup>

Paseo central: 10.238 m<sup>2</sup>

Pavimento de empedrado  
sobre terraplén: 85.527 m<sup>2</sup>

## MEJORAMIENTO VIAL DE VARIAS CALLES DEL BAÑADO SUR, BARRIO SAN CAYETANO

Mejoramiento vial en Alfredo Ramos (Brasil) entre 34° y 36° Proyectadas; Alfredo Ramos (Brasil) entre 36° Proyectada hasta fin de calle; 38° Proyectada entre Paulino Antola (Rojas Silva) y Arroyo Morotí; Juan B. Ayala (Capitán Figari) entre 38° y 42° Proyectadas; Calle sin nombre entre 42° y 44° Proyectadas; 33° Proyectada entre Rojas Silva y Brasil; Brasil entre 33° y 34° Proyectadas; 39° Proyectada entre Capitán Figari y Pa'i Pérez.

5.355m<sup>2</sup> de pavimento hormigón hidráulico. Avance: 100%, con recepción provisoria del contrato original y convenio modificatorio 2.



**MEJORAMIENTO VIAL DE  
LAS CALLES TACUARY Y  
38° PROYECTADA  
ID DE OBRA:  
405 982 (Lote 1).**

Construcción de pavimento  
de hormigón hidráulico en la  
calle Tacuary e/ 30° y 35°  
Proyectadas.  
Avance 100%, con recepción  
provisoria.  
2.400 m<sup>2</sup> de Hormigón  
Hidráulico.



**CANTIDADES  
EJECUTADAS EN  
MEJORAMIENTO VIAL DE  
LAS CALLES TACUARY Y  
38° PROYECTADA ID DE  
OBRA: 405982 (Lote 2).**

Construcción de  
pavimento de  
hormigón hidráulico  
en la calle 38°  
Proyectada e/ Avda.  
Japón y Tte.  
Cantaluppi.  
Avance 100%, en  
proceso de recepción  
provisoria.  
2.884 m<sup>2</sup> de  
hormigón hidráulico.



## MEJORAMIENTO VIAL DE LAS AVENIDAS FERNANDO DE LA MORA Y CARLOS ANTONIO LÓPEZ

Mejoramiento vial de la  
Avda. Fernando de la  
Mora entre Bartolomé  
de las Casas y Avda.  
Defensores del Chaco.  
44.000 m<sup>2</sup> de  
pavimento asfáltico.  
5.707 m<sup>2</sup> de pavimento  
de hormigón hidráulico.  
1.150 m<sup>2</sup> de  
mejoramiento de paseo  
central.



Mejoramiento vial  
Avda. Carlos A. López

## CANTIDADES EJECUTADAS

Avance 100%, con recepción provisoria del  
contrato original y convenio modificatorio 1.



Mejoramiento vial  
Avda. Fdo. de la Mora

# OBRAS CON LAS COMISIONES VECINALES

La Municipalidad de Asunción destina recursos municipales a los Fondos para Proyectos Especiales.

Estos están administrados por el Consejo Administrador de los Fondos para Proyectos Especiales (CAFPE), generados para fortalecer el trabajo de las comisiones vecinales, impulsando proyectos de mejoramiento.

De esta forma, estas obras se llevan adelante conjuntamente con las **343 comisiones vecinales**, creadas en los 68 barrios de la capital, con una inversión que ronda los **3.657.745.929 guaraníes**.

Las comisiones vecinales son como los brazos ejecutores municipales en los barrios y la gestión conjunta con las mismas, es la manera más rápida y eficaz de trabajar, para llevar a cabo las obras que las comunidades barriales precisan en sus zonas.

Por eso, cada vez más se apuesta a este sistema para llevar soluciones efectivas a los vecinos, siendo ellos los mismos actores principales de las obras ejecutadas.



Entrega de cheques a comisiones vecinales



Plaza Villa Golondrina



Plaza San Roque  
González de Santa Cruz



Plaza Tajy Poty

# Rendición de Cuentas 2024

## **FONACIDE**

Fondo Nacional de Inversión  
Pública y Desarrollo



El FONACIDE (Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo) fue creado por la Ley N° 4758/2012, con el objetivo de asignar, de manera eficiente, los ingresos provenientes de la compensación por la cesión de energía de la Itaipu Binacional al Brasil. Este fondo se utiliza para financiar inversiones en áreas clave como: educación, salud, infraestructura y desarrollo social.

Nº	ACTIVIDAD	MONTO EN (GUARANÍES)	PRODUCTOS	INSTITUCIONES EDUCATIVAS BENEFICIADAS
1	Adquisición de Mobiliario para Distintas Instituciones Educativas - ID 450.430 ADJUDICADO AÑO 2024	Gs. 219.830.000	815 Sillas para alumno 935 Mesa pupitre para alumno	1-Escuela Básica 617 Virgen Stella Maris 2-Escuela Básica 660 San Francisco y San Blas 3-Colegio Nacional Pdte. Franco 4-Escuela Bas. 409 Rep. Federal de Alemania 5-Colegio Nacional Las Residentas 6-Colegio Nacional Santísima Trinidad 7-Centro Educativo Hermann Gmeiner 8-Esc. Bas. 4878 Municipal Oñondivepa 9-Esc. Bas. 1909 Fray Bartolomé de las Casas 10-Escuela Bas. 407 Elisa Alicia Lynch 11-Coleg. Nac. Dr. Luis Alberto de Herrera 12-Escuela Básica Nro. 7 Sotero Colman 13-Esc. Nro. 19 República Oriental del Uruguay 14-Escuela Básica 3.620 San Pedro 15-Esc. Bas. 6 Dr. José G. Rodríguez de Francia 16-Esc. Bas. 260 Ntra. Sra. de la Asunción 17-Coleg. Nac. Juan Alberto Samaniego

